# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平5-107381

(43)公開日 平成5年(1993)4月27日


(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示簡析		
C 2 1 C 13/00 E 0 4 C 21/14 E 0 4 H 5/02	F	7228-2E 9024-2E 7808-2G 7808-2G	G21C	13/ 00 D Q 発査請求 未請求 請求項の数1(全 6 ]	Q .	
(21)出願番号 特願平3-270660		(71)出願人	財団法人電力中央研究所			
(22)出쳸日	平成3年(1991)10月18日		(72)発明者	東京都千代田区大子町1丁目6番1号 木下 泉 東京都泊江市岩戸北2の11の1 財団法人 電力中央研究所 泊江研究所内		
			(72)発明者	佐藤 東京都	守意	一丁月1番1号 株式会社
			(74)代理人	弁理士	猪股	祥見

# (54)【発明の名称】 原子力プラントの建設方法

## (57)【要約】

【目的】プレハブ製原了力プラントの現地工事を排除し て工期の短縮を図る。

【構成】原子炉建屋ベースマット11上で原子炉格納容器の外周領域を数区画にし、各区画に配置する機器・配管及び電気品を各区毎に鉄骨製ポックスに収納した第1から第6の区画モジュール1~6として工場で製作する。区画モジュール1~6を現地の原子炉建屋ベースマット11上に据付ける。原子炉格納容器に面するボックス同志を接合し、原子炉格納容器上方をコンファイメントモジュール7~9で覆い、区画モジュール1~6のボックス程に搭載し、接合する。区画モジュール1~6の据付けて程で、原子炉格納容器及び原子炉本体を一括製作した原子炉モジュール12を原子炉建屋ベースマット11上に据付ける。区画モジュール1~6、コンファイメントモジュール7~9及び原子炉モジュール12を原子炉建屋ベースマット11上に据付け接合し、モジュール間同志の配管及び電気配線の結合工事を行う。

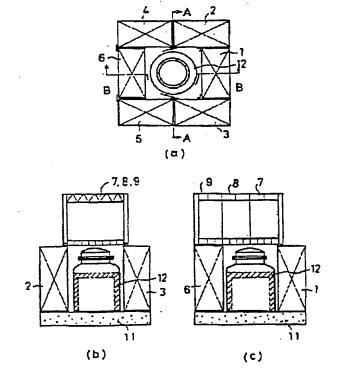

DEST AVAILABLE COPY

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 原子伊達屋ベースマット上で原子伊格納容器の外周領域を数区分に区分する工程、前記数区分の各々に配置される機器・配管および電気品を収納した区両モジュールを製造工場で製作する工程、前記区両モジュールを順次前記原子伊建屋ベースマット上に搬入し据付ける工程、前記原子伊格納容器の上方をコンファイメントボックスで覆い、このコンファイメントボックスを前記区画モジュールに搭載し接合する工程、前記区画モジュールを順次現付ける工程中に原子伊モジュールを前記原子伊建屋ベースマット上に据付ける工程、前記区画モジュール・コンファイメントボックスおよび原子伊モジュールを前記原子伊建屋ベースマット上に据付け接合する工程、前記モジュール間同志の配管および電気配線工事を行う工程とからなることを特徴とする原子力プラントの建設方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】木発明は原子炉建屋ベースマット上に設置・同定される設備モジュールの骨組みおよびボ 20ックスを結合して原了炉モジュールを収納する原子炉建物とし、中・小形原子炉に好適した原子カプラントの建設方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】原子炉格納容器およびこれが内包する原子炉本体を製造工場で統合・括製作し、バージで海上輸送し、大形トランスボータおよびころ引きで原子炉建屋ベースマット上に投入する機器の製作、据付方法が中・小形原子炉を対象に総重量3000トン位まで可能である。【0003】この場合、原子炉建屋ベースマット上に建 30築される振器室を従来から知られている鉄筋コンクリート製建物とする原子力プラントの構成を図3および図4によって説明する。

【0004】すなわち、図3(b)および(c)に示したように鉄筋コンクリート製の原子炉建屋ベースマット11上に、製造工場で統合一括製作された原子炉モジュール12が掲付けられ、その周辺に井桁形の鉄筋コンクリート製機器等13が構築される。原子炉モジュール12の上方はコンファイメント構造物14を機器率13の頂部に構築して覆われている。

【0005】原子炉モジュール12は原子炉格納容器と、これが内包する原子が木休およびこの原子が木休を支持する鉄骨フレームとから構成され、製造工場で製作され、一体で現地に輸送を可能とするものであるが、30~50万KWeの中・小形原子炉を対象とすると、総重量が約3000トンとなる。

【0006】この約3000トンの原子炉モジュール12を原子炉建屋ベースマット11上に据付けるには、吊り下げ式の場重機の能力を大幅に上まわるので、ころ引きで原子炉建屋ベースマット11上の中央に引き込む。この際、井

桁形の鉄筋コンクリート製機器率13が完成していると原 了炉モジュール12の引き込みは不可能であり、引き込み 口のみ機器室の建築を後まわしにすると、鉄筋コンクリート製の壁・床の建上げ、コンクリートの乾燥工程が既 完成部の鉄筋コンクリート製機器室の壁・床の建上げ、 コンクリートの乾燥工程とシリーズになり、現地工期が 長期化する。そこで、原子炉モジュール12を原子炉建屋 ベースマット11上に引き込んだ後に、川桁形の鉄筋コンク リート製機器室13を建築し、さらにその頂部にコンファイメント構造物14を原子炉モジュール12を覆うように 構築する。完成した鉄筋コンクリート製機器室13内に機器・配管および電気品を据付けると共にケーブル類を布 設する。最後に原子炉モジュール12と周囲設置の系統設 備との結合を行ってプラントの場件を完了する。

【0007】以上に説明した建設工程を図4に示す。図

2

中、報軸はプラントの着手から完了までの期間を月で示し、縦軸は各工程の工事項目を示している。図4から明らか公ように機器製作着手から岩盤検査まで6ヶ月間を要し、プラント掲付完了までは36ヶ月(3年)間要する。すなわち、機器製作着手時には原子炉モジュールの工場製作が行われ、原子炉モジュールは約15ヶ月間経て完成する。この工程と並行して岩盤検査が6ヶ月後に行われ、その後に原子炉建屋ベースマット打設工事が行われる。この打設工事完了後に原子炉モジュールは輸送され、据付工事が行われる。原子炉モジュールの据付工事完了後、機器室建築工事(9ヶ月)、機器室内機械・電気工事(6ヶ月)を経て、仕上げ工事(4ヶ月)後にプラント掲付は完了する。この全工事期間は3年間要している。

#### 0 [0008]

【発明が解決しようとする課題】原子炉格納容器および 原了炉本体を製造工場で統合・括製作することは、現地 の機器据付の工事量を大幅に削減するのに極めて有効で ある。しかしながら、複器室13を従来の鉄筋コンクリー ト製とすると、原子炉格納容器の外周に配置される機器 配管類の据付開始までに必要とされる機器室躯体の完成 に鉄筋コンクリート造りの壁および床の階層毎の建上げ のた約約10ヶ月を費やすことになる。また、この期間は 先入機器の据付等のため、建屋上事との干渉があり、原 40 子炉格納容器および原子炉本体の統合一括製作を製造工 場で行った割には、現地工事量削減の効果が発揮されな い。さらに、製造工場で統合一括製作した原子が格納容 器および原子が木体を現地に掲付ける時点が現地工事工 程の早期であり、この時点からブラント設備全体の保付 完了までの現地工程が長期化し、製造工場での製作者手 から現地でのプラント設備全体の据付完了までの裁工期 の短縮を十分期待することができないなどの課題があ

の場互殴の能力を大幅に上まれるので、ころ引きで原子 【0009】木発明は上記課題を解決するためになされ 炉建屋ベースマット11上の中央に引き込む。この際、井 50 たもので、原子炉格納容器および原子炉本体を製造工場

1

で統合一括製作する原子リブラントの建設方法におい て、現地工期のみならず製造工場での製作若手から、現 地でのアラント設備全体の据付完了までの総工期の双方 を夫々短縮し、また現地での複器据付工事量および建築 工事量を大幅に削減することができる原子力プラントの 建設方法を提供することにある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明は原子原建屋ベー スマット上で原了炉格納容器の外周領域を数区分に区分 する工程、前記数区分の各々に配置される機器・配管お 10 よび電気品を収納した区画モジュールを製造工場で製作 する工程、前記区両モジュールを順次前記原子が建屋へ ースマット上に搬入し据付ける工程、前記原子炉格納容 器の上方をコンファイメントボックスで覆い、このコン ファイメントボックスを前記区画モジュールに搭載し接 合する工程、前記区画モジュールを順次据付ける工程中 に原子炉モジュールを前記原子炉建屋ベースマット上に 据付ける工程、前記区両モジュール、コンファイメント ボックスおよび原子がモジュールを前記原子が建屋ベー スマット上に据付け接合する工程、前記モジュール間同 志の配管および電気配線工事を行う工程とからなること を特徴とする。

## [0011]

【作用】本発明では分割輸送し、原子炉建屋ベースマッ ト上に設置・固定される設備モジュールの骨組みおよび ボックスを結合して原了炉モジュールを収納する原了炉 建屋とする。すなわち、原子切モジュールの外周を取囲 んで設置される機器・配管・電気設備およびこれを収納 し、支持する部屋躯体の領域に関し、これを数区画に分 割する。その各区両を製造工場で一括製作する区画別設 備モジュールとし、原子炉の設置地点に輸送し、原子炉 建屋ベースマット上に搬入・固定する。そして、各区面 別設備モジュール同志を結合し、気密接合することによ り原子炉モジュールを収納するコンファイメント領域を 形成する。これにより、原子炉建屋の機能を保持させる と共に原子が格納容器および原子が木体を製造工場で統 合一折製作する場合のプラント全体の建設工期短縮、現 地鐵器据付工事量削減の効果を発揮させる。

# {00121

【実施例】図1および図2を参照しながら本発明に係る 原子力プラントの建設方法の一実施例を説明する。な お、図1は本発明方法によって建設される原子カプラン トの概略的構成を示しており、図1 (a)は平面図で、 (b)は(a)のA-A矢視断面を、(c)は(a)の B B断面を示している。

【0013】すなわち、鉄筋コンクリート製の原子力建 屋ベースマット11上に、製造工場で夫々、統合一括製作 された原子がモジュール12、第1から第6の区両モジュ ール1、2、3、4、5、6、および第1から第3のコ

る。

【0014】原丁伊モジュール12は原丁伊格納容器と、 これが内包する原了伊本体および原了伊本体を支持する **鉄骨フレームとから構成され、製造工場で製作・組立さ** れ、一体で現地に輸送を可能とするものである。

【0015】第1から第6の区両モジュール1、2、 3.4.5.6は原子担モジュール12の外間に設置さ れ、相互に系統機能を果たすべく結合されるもので、個 々の区画モジュール1~6は鉄骨フレームのボックスと これが内包する機器・配管および電気品とから構成され 製造工場で製作・組立され、一体で現地に輸送を可能と するものである。

【0016】第1から第3のコンファイメントモジュー ル7.8.9は原子炉モジュール12の上方を覆い、第1 から第6の区画モジュール1、2.3、4.5、6の頂 部に結合されて原了炉建屋の中央部屋根囲いを構成する もので、鉄骨フレームのボックスとして製造工場で一体 または数個の構造体として製作され、そのまま現地に輸 送を可能とするものである

製造工場で製作し、バージにて現地に海上輸送したモジ ュールを次の順序で原子炉建屋ベースマット上に据付け る。すなわち、第1から第5の区面モジュール1、2、 3, 4, 5を順番に人形トランスポータおよびころ引き で原子炉建屋ベースマット11上にコの字形に設置・固定 する、次に第1から第3のコンファイメントモジュール 7.8,9をクレーン車で順次区画モジュール1~5の 頂部に搭載固定する。大形トランスポータで原了炉建屋 ベースマット11の近傍まで嵌入された原子炉モジュール 12を第4と第5の区両モジュール4とうの間から原子が 建屋ベースマット11上の中央部にころ引きで引き込み固 定する。第4と第5の区画モジュール4と5の間に第6 の区画モジュール6をころ引きで引き込む。第1から第 6の区画モジュール1~6および第1から第3のコンフ アイメントモジュール7,8,9相互間を結合し気密接 合を施す。最後にモジュール間同志の配管および電気配 縁の結合工事を行う。このような工程を経て原子力プラ ントの建設を行う。

【0017】図2は本発明による原子力プラントの建設 工程図で、横軸は期間を月で、縦軸は工事項目を示して いる。図2から明らかなように機器製作着手と岩盤検査 からプラント掲付完了まで24ヶ月間(2年)であり、従 来例の3年に比較して3分の2の期間で完了している。 すなわち、原子炉建屋ベースマット打設工事および原子 炉モジュール工場製作工事と並行して区画モジュールの 工場製作が行われ、原子炉建屋ベースマット打設工事完 了後、第1から第5の区面モジュール1~5の据付けが 行われる。次に原子炉モジュールは輸送され据付けら れ、第6の区両モジュール6を据付ける。これまでの期 間は18ヶ月間である。最後にモジュール間結合および遮 ンファイメントモジュール7、8、9が据付けられてい。50 敬コンクリートが注入され、仕上げ工事を経て原子力ブ

5

ラントの据付けは完了する。本実施例による全ての工事期間は24ヶ月間である。

【0018】上記失施例によれば次に述べる効果がある。すなわち、製造工場で一括製作された各種モジュールを原子がベースマット上に据付けることにより鉄筋コンクリート製の壁・床が不要、かつ、機器・配管・ケーブル類の現地保付工事量が大幅削減され現地工期の短縮が可能となる。原子がモジュールの現地很人時期を各種モジュール投入の終盤にすることにより、原了がモジュール製作の岩盛検査前リードタイムを短縮できるので、製造工場での製作者手から現地プラント据付完了までの総建設工期の短縮が可能となる。

【0019】なお、本発明は上記実施例において原子炉 建屋ベースマット上での各モジュールの設置順序に関 し、原子炉モジュールの工場製作工期をプラント全体の 建設工期不変のまま長く確保するため、区画別設備モジ ュールの設置を先行し、原子炉モジュールの設置時期を 遅らせる工程を設けることができる。

【0020】また、区画別設備モジュール全数のうち、 1モジュールのみを除いて先行設置し、原子炉建屋ベー 20 スマット上の周囲領域に開口区画を形成せしめ、原子炉 モジュールを原子炉建屋ベースマット上にころ引き等に よる引き込み搬入を可能とする工程を設けることができ る。

#### 100211

【発明の効果】本発明の効果は次のとおりである。

(1) 製造工場での原了炉モジュール製作着手から現地で

のプラント据付完了までの総建設工期が従来例の約56ヶ 月が約24ヶ月となり、約12ヶ月の工期短縮が可能となる。

- (2) 岩盛検査から原子力プラント据付完了までの現地工 期が従来例の約30ヶ月が約24ヶ月となり、約6ヶ月の工 期短縮が可能となる。
- (3) 現地の機器保付工数が大幅に削減され、製造工場での製作部分が格段にふえ、品質の確保が有利となる。 【図面の簡単な説明】
- 10 【図1】(a)は本発明に係る原子力プラントの建設方法の一実施例を概略的に示す平面図、(b)は(a)におけるAーA矢視方向を示す縦断面図、(c)は(a)におけるBーB矢視方向を示す縦断面図。


【図2】図1における原子力フラントの建設工程を示す 工程図、

【図3】(a)は従来の原子力プラントの建設方法を概略的に示す平面図、(b)は(a)におけるA-A失視方向を示す縦断面図、(c)は(a)におけるB-B失祝方向を示す縦断面図。


20 【図4】図3における原子力フラントの建設工程を示す工程図。

# 【符号の説明】


1,2,3,4,5,6…第1か6第6の区画モジュール、7,8,9…第1か6第3のコンファイメントモジュール、11…原子炉建屋ベースマット、12…原子炉モジュール、13…機器室、14…コンファイメント構造物。

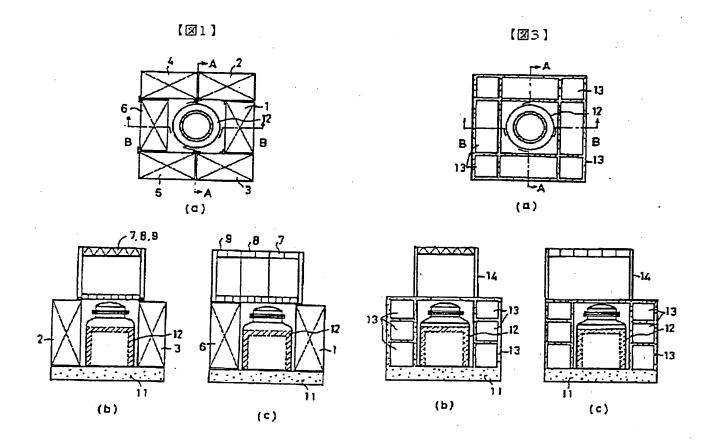

[図4]

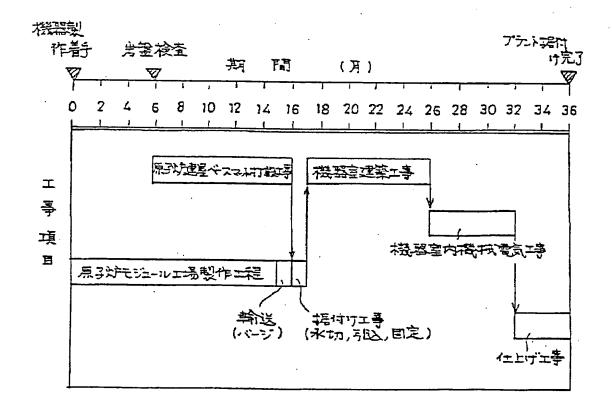

【図2】

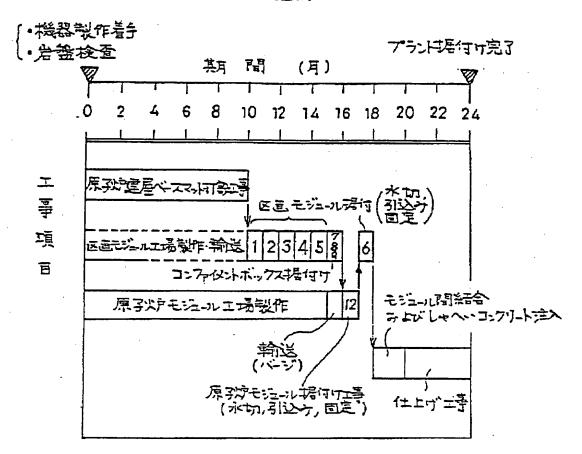

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.
